

上海环城生态公园带暨重点绿化项目建设推进

工作简报

(第三十期)

环城生态公园带暨重点绿化建设项目协调推进办公室

2024年9月30日

本期导读

◆领导动态

浦东新区副区长余颖专会审议沔西公园改造工程工可投资

◆市级动态

浦东新区外环绿道断点贯通工作进展调研

上海市林业行业森林防火知识和技能竞赛工作部署会日前召

开

普陀区外环绿道断点贯通工作进展调研

徐汇滨江公园方案专家评审会日前召开

外环西抬升工程涉外环绿道沪青平断点贯通协调会日前召开

环城生态公园带城市品牌塑造商议策划

浦东新区外环绿道及断点贯通项目现场踏勘

环城生态公园带城市品牌建设相关调研

2024年度环城生态公园带暨重点绿化项目第八次建设推进工作会议召开

“十五五”规划研究和编制工作部署会日前召开

◆ **区级动态**

浦东新区生态环境局局长康永良听取沔西公园改造方案
各区工作日志

◆ **项目进展**

环城生态公园带和重点绿化项目 9 月推进情况汇总表

【领导动态】

浦东新区副区长余颖 专会审议沔西公园改造工程工可投资

9月13日，浦东新区副区长余颖召开区政府专题会议，审议沔西公园改造工程项目工可投资事宜。区生态环境局黄海华副局长出席，区发改委、区财政局、区生态环境局（基建处、基建中心）、康桥镇相关负责人参会。



会议听取了新区生态环境局关于沔西公园改造工程工可方案、投资情况汇报及其他部门的相关意见。浦东新区副区长余颖提出相关工作要求：**一是**原则同意沔西公园改造工程工可方案及投资，建议下一步工作中优化深化设计方案，突出亮点特色；**二是要**充分考虑与周边公园和外环绿道贯通、连通的可行性，预留实施空间；**三是要**整合公园建设和后续管养运营资源，探索公园管养的可持续性发展；**四是要**加快推进项目实施，以确保年底前完成开工任务。

【市级动态】

市绿建中心调研浦东新区外环绿道断点贯通工作进展

9 月 4 日上午，市绿建中心主任张莹萍、副主任王铁飞调研浦东新区外环绿道断点贯通工作进展，浦东新区生态环境局副局长刘军及生态环境局绿林处、基建处、林业站、基建中心、浦东建管公司、技术单位相关负责同志参加调研。



在听取浦东外环绿道断点贯通进展及 **2025** 年贯通计划后，与会同志就架桥贯通断点项目展开讨论。经深入研讨，新区生态环境局明确了浦东 **2025** 年架桥贯通断点项目清单、实施路径及项目设计方案、规划方案编制等相关前期工作进度节点。会议同时对金海路断点贯通事宜展开讨论，明确了断点骑步行无障碍贯通工作要求。市绿建中心主任张莹萍表示：外环绿道断点贯通是加强绿道系统衔接，健全城市绿道网络体系，提高市民大众获得感、幸福感、安全感的重要举措，新区生态环境局要高度重视、提前谋划、加强协调、全力推进，确保完成总体目标任务，打造品质优秀、市民满意的“民心工程”。

市绿建中心协同开展

上海市林业行业森林防火知识和技能竞赛工作部署会

9 月 4 日，由市绿化市容局、林业总站、绿建中心、宣教中心、嘉定区绿化市容局、嘉定区应急管理局等单位相关领导组建竞赛组织委员会，在嘉北郊野公园召开上海市林业行业森林防火知识和技能竞

赛工作部署会。

会上，林业总站相关负责人详细介绍并说明了本次森林防火知识和技能竞赛的实施方案、项目规则等内容，并组织参观了此次竞赛的场地。市绿建中心副主任马少初指出：近年来环城绿带陆续改造提



升成为环上公园，游客量也随之迅速增长，环城绿带防火工作关系到人民群众的生命财产安全，各单位应高度重视竞赛工作，通过竞赛操练队伍、提高水平。

市绿化市容局林业处对竞赛提出相关要求：**一是**提高认识、强化责任。通过演练使各行业单位在思想上高度重视，提升防火技术水平，促进相互间取长补短，做好火灾等突发安全事件的应对能力；**二是**集中精力、做好准备。各级单位要认真学习比赛规则，备齐装备，操练技能，充分做好赛前准备工作；**三是**加大宣传、提升影响。在竞赛结束后，各级单位要用好线上线下媒体，宣传防火知识、消防法规等，提升整个社会的防火意识。

市绿建中心赴普陀调研绿道断点贯通工作

9月5日，市绿建中心主任张莹萍带队赴普陀区开展实地调研，区绿化市容局及桃浦镇相关负责人陪同调研。

调研组一行依次对普陀区真南路、金昌路、武威路以及新槎浦河的绿道断点进行了现场勘查，设计单位对断点贯通方案进行了介绍，

普陀区绿化市容局也就真南路、金昌路、武威路几处断点的后续贯通计划进行汇报。市绿建中心主任张莹萍充分肯定了普陀区绿化市容局在推进环上公园、重点绿化项目建设中所做的工作，并针对普陀区



外环绿道断点贯通工作提出要求：一是断点贯通要充分结合现场实际，对滨河区域绿道加强安全保障措施，确保后续通行安全；二是对金昌路断点的打通工作，需与嘉定区进行充分的沟通协调，并进一步与铁路部门探讨断点打通的可能性；三是尽快启动项目实施，确保三季度和年度任务能够按既定计划顺利完成。

徐汇滨江公园方案专家评审会日前召开

9月6日，市绿建中心组织召开西岸自然艺术公园二期（徐汇滨江公园）西区设计方案评审会，市绿化市容局规划处、公绿处、区绿容局相关负责同志及陆卫亚、庄伟、涂秋风三位专家参加评审。




会上，设计单位详细汇报了徐汇滨江公园（西岸自然艺术公园二期）西区设计方案，各参会单位、专家对公园主题定位、功能布局、分区设计、指标平衡等进行了充分讨论，并提出相关意见：一是本项目作为环城生态公园带（徐汇段）的重要组成部分，其规划设计应紧

密围绕“环上”公园的文化张力与复合生态休闲游憩功能进行；二是设计单位应补充项目现状条件分析，包括项目地块的具体位置、用地性质、现状绿化本底调查和综合分析、地质和土壤资料、现状水系水文资料及现状地形、道路、建筑、基础设施、保留与移除植物的具体分析；三是优化完善方案竖向设计、水体设计、园路及铺装设计、种植设计、建构筑物、生物多样性及经济技术指标等相关专项设计。

市绿建中心肯定了专家意见，并指出：徐汇滨江公园建设关系到民心工程年度建设任务的顺利完成，应在方案中补充完善相关信息，尽快上报优化后的方案；公园方案应深化主题布局、建筑体量、公园路网、种植特色等方面的细节推敲，严格控制技术指标及投资估算，围绕生物多样性、儿童友好、无障碍设计、绿化四化、四新技术、智慧公园等专题完善相关内容。下一步，西岸自然艺术公园（二期）徐汇滨江公园方案深化调整后，将尽快完成工可编制上报，追赶项目节点进度，确保年内开工目标任务顺利落实。

外环西抬升工程涉外环绿道 沪青平断点贯通协调会日前召开

9月14日上午，为加快推进外环绿道断点贯通建设，市绿建中心组织召开外环西抬升工程涉外环绿道沪青平断点贯通协调会。市绿建中心、长宁区绿化市容局、区建管委、闵行区绿化市容局、区交通委及相关技术单位负责同志参加。

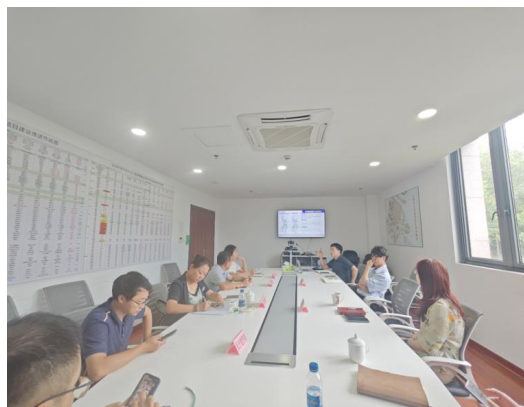

在听取技术单位汇报外环绿道沪青平断点贯通方案及涉外环抬升工程相关内容后,就断点贯通形式、线路及项目实施路径展开讨论。经研究,初步明确了绿道断点骑、步行贯通形式、线路走向及分区分段实施方式,要求两区在现有方案基础上持续深化项目立项、用地、资金落实等相关前期工作开展,同步加强与外环西抬升工程实施层面对接。

市绿建中心赴同济大学艺术与传媒学院 商议环城生态公园带城市品牌塑造工作

9 月 20 日、9 月 26 日,市绿建中心主任张莹萍带队赴同济大学艺术与传媒学院开展交流,商议环城生态公园带城市品牌塑造工作,同济大学艺术与传媒学院院长李麟学及相关专业教授出席会议。



会上,市绿建中心介绍了环城生态公园带建设情况和环城生态公园带城市品牌策划设想,同济大学艺术与传媒学院对学院的组织架构、相关活动开展以及近几年取得的重要成果作了简要介绍。为纪念环城绿带建设 30 周年,市绿建中心拟策划举办“上海环城生态公园带”城市品牌形象大赛,双方就大赛的组织架构、赛事流程等具体细节进行了交流讨论,并一致认为:本次大赛除了面向全社会公开征集之外,也欢迎国内外专业设计人士和企业、创作团队、院校师生及创

意爱好者参与；为确保作品质量，还将精准发动同济大学、上海交大等高校设计专业师生，以及设计研究机构等对口专业人士踊跃参与。同时双方还将在环城生态公园带城市品牌塑造方面加强沟通联系，谋划“十五五”，拓宽工作思路，挖掘城市品牌内涵，助力上海公园城市建设，共同绘制上海环城生态公园带的美好蓝图。

市绿建中心踏勘浦东新区 外环绿道及断点贯通项目现场

9月26日，市绿建中心赴浦东新区踏勘2024年度外环绿道及断点贯通项目建设进展，浦东新区林业站、相关设计单位、施工单位负责同志参加。



在现场踏勘高三港至凌海路段绿道、东靖路至南群河段绿道以及凌横浜、无名河2#、南浜沟等绿道断点贯通项目施工现场后，浦东新区林业站介绍了项目总体进展，截至目前，绿道工程进度约45%、5处绿道断点贯通项目进度约35%，项目建设稳步推进。市绿建中心表示：绿道和断点贯通项目已列入民心工程，意义重大，一定要高度重视；建设过程中，要关注施工质量，加强日常巡检，提升工程品质；要加快绿化种植、桥梁建设等工程进度，确保绿道及断点贯通项目按节点有序推进，按期完成年度建设任务。

市绿建中心赴长宁外环生态绿道 开展环城生态公园带品牌建设相关调研

9 月 26 日，市绿建中心主任张莹萍带队赴长宁外环生态绿道开展品牌建设相关调研，上海公益新媒体中心及长宁区绿化中心相关负责人参加。



市绿建中心听取长宁区绿管中心相关负责人关于绿道及驿站的设计理念及日常使用情况的介绍，并就环城生态公园带整体品牌暨环城绿带建设 30 周年宣传策划开展座谈。上海公益新媒体中心围绕如何调动各区积极展现亮点、提升市民感受热度、确保宣传成果立体化和丰满化等方面对品牌宣传策略方案进行了详细介绍。与会各方对环城绿带建设 30 周年案例征集、成果展示、宣传推广以及低碳展进绿道等方面进行了充分讨论。

下一步，市绿建中心将不断加强同区绿化部门及社会机构的合作，同频共振，以环城绿带建设 30 周年为契机，扩大社会影响力，提高公众认知度，打响环城生态公园带城市品牌建设，全面彰显环城生态公园带生态价值、文化价值和社会价值。

2024 年度环城生态公园带 暨重点绿化项目第八次建设推进工作会议召开

9 月 27 日下午，市绿建中心组织召开了年度第八次项目建设推进工作会议。市绿建中心党支部书记沈帅、副主任王铁飞、

相关部门负责同志及各涉及区分管领导、项目建设负责同志出席会议。

会上，各区详细汇报了环城生态公园带及重点绿化项目建设进展，并就建设推进存在



问题困难展开深入探讨交流。市绿建中心相关部门负责同志表示：各区要全力推进，确保完成年度建设任务，并合理排定明年建设计划，有序开展相关前期工作；建设推进过程中，要注重方式方法，加强与各相关部门沟通，重点突破难点堵点；施工过程中，要加强现场管理，严格按图施工，加强宣传教育，确保安全生产文明施工。

市绿建中心书记沈帅对项目建设推进提出相关工作要求：一是要注重项目管理。各区应加强统筹，按照年度目标，倒排时间节点，全力推进建设，应做好预判，留足提前量，确保按期完成各项建设任务；二是要注重施工质量。各区应严把项目设计、施工各个环节，加强施工过程监督管理，确保施工质量，应加强建设管理衔接，提升整体服务品质，要经得起市民游客检验；三是要注重施工安全。做好应对台风天气及秋季防火相关安全措施，重点加强节日期间安防工作，加强施工现场安全巡查，及时发现并处理安全隐患，杜绝安全事故发生。四是要注重宣传联动。环上公园、绿道等建设项目宣传中，要加强协调沟通、市区统筹联动，发挥规模效应；设计方案民意征询对象应多元化，满足不同层次服务需求，扩大宣传面。

上海市公共绿地建设事务中心 开展“十五五”规划研究和编制工作部署

9 月 27 日，上海市公共绿地建设事务中心领导班子、各科室负责人、业务骨干专题研究部署中心“十五五”规划研究和编制工作。



会上，结合中心职能，提出从公园城市建设及相关顶层设计研究、环城生态公园带及重点绿化项目建设推进研究、环城生态公园带综合管理研究、信息化、科普活动及宣传、人才发展等保障机制研究 4 个专题研究编制中心“十五五”规划。各科室根据牵头负责的专题内容，深入分析现状问题瓶颈，交流思路举措，进一步明晰完善“十五五”规划研究和编制工作框架。

中心领导围绕“十五五”规划研究和编制工作进行相关部署，成立中心“十五五”规划工作小组，由领导班子任组长、各科室负责人任组员，建立规划科负责日常事务、对接协调、汇总上报，其他科室按照专题分工协同推进、把握节点、定期交流的工作机制。同时，对“十五五”规划研究和编制工作提出三点工作要求：一是把握规划要求，既要贯彻落实国家重大战略，也要结合市委市政府要求，服务上海地方发展需求。推动公园绿地规划建设运营管理助力区域经济社会文化发展、提升人居环境品质，实现生态、生产、生活有效融通；二是谋划规划重点，客观分析行业发展面临的形势和机遇，既要扩大增量，也要优化存量。结合第二个千

园工程研究，总结评估环上公园建设经验、建设标准和资金政策，探索研究环外、五大新城规划建设实施路径，加强外环绿道体系建设和绿道管理研究，有力推进环城生态公园带城市品牌和运营机制建立；三是增强规划合力，既要注重与系统内兄弟单位、相关处室的主动对接，也要加强与系统外企业高校、其他行业以及国内外其他城市的跨界合作，整合资源、凝聚合力，通过规划编制引领社会共识，积极助力上海公园城市建设。

【区级动态】

浦东新区生态环境局

局长康永良听取沔西公园改造工程方案

9月10日，浦东新区生态环境局党组书记、局长康永良听取沔西公园改造工程方案，副局长刘军、黄海华出席会议，局机关基建处、绿林处、基建中心、区林业站、康桥镇及相关技术咨询单位等参加会议。

会上，技术咨询单位汇报了项目工可方案及推进节点计划，基建中心及基建处汇报了近期急需协调解决的问题，康桥镇表达了相关建设需求，绿林处及林业站提出行业指导意见。浦东新区生态环境局局长康永良提出相关工作要求：一是要围绕环城生态公园带建设要求，尽可能保留沔西原有优良生态基底，如林水复合要以自然为主，努力营造人与自然和谐共生的美好环境；二是要充分考虑周边居民及社会公众的游园需要，重点研究交通分流、无障碍便民设施、安全防控、林下骑行等，确保环境舒适、安全、便捷；三是要充分考虑财力投资效

果，按实际需要合理安排工程造价，满足必要的景观及使用需求，突出亮点；**四**是要积极加强沟通协调，按节点计划加快项目推进，努力完成年内开工的建设目标。

各区工作日志

◆徐汇区◆

9月26日，徐汇西岸自然艺术公园(西区)设计方案批复。

◆普陀区◆

9月9日，普陀新扬公园完成勘察设计招标。

9月12日，武威路、真南路、金昌路断点贯通项目进场施工。

9月27日，新扬公园取得工可批复。

◆宝山区◆

9月19日，宝山原吉公园、杨盛公园项目完成施工招标。

◆松江区◆

9月30日，松江新城中央公园(中央绿带)项目启动设计招标。

◆金山区◆

9月23日，金山工业区大道南侧绿地取得初设批复。

◆青浦区◆

9月14日，青浦上达中央公园(北园)取得项建书批复。

【项目进展】

环城生态公园带和重点绿化项目 9 月推进情况汇总表

（一）外环绿带功能提升

项目类型	年度计划	区段	项目	9 月计划	实际进度
环上公园	建成开放 (8 座)	浦东新区	赵家沟秀林公园、孙桥公园	施工进度 75%	施工进度 75%
			起点公园、海徐路公园	施工进度 75%	施工进度 70%
		宝山区	大黄村公园	施工、监理招标完成	施工招标
			原吉公园、杨盛公园	施工、监理招标完成	进场施工
		嘉定区	蝶语园	竣工验收	质监验收完成
	开工建设 (10 座)	浦东新区	张家浜滨河公园、新丰公园、凌桥公园、洲海公园	工可评审	工可批复、设计监理招标
			沔西公园	工可评审	工可待批
		徐汇区	徐汇滨江公园	工可批复、设计招标	方案批复、工可上报，滞后
		普陀区	新杨公园	施工/监理上网招标	设计招标完成、工可批复
		宝山区	盛宅公园、水产路公园	工可评审/意见征询	方案评审、工可编制
		嘉定区	申纪港公园	施工、监理招标完成	工可编制，滞后
外环绿道	建成开放 (12 公里)	浦东新区	专项工程（9 公里）：2024 年浦东新区环城绿带绿道建设 专项工程、2024 年浦东新区环城绿带设施维修工程	施工进度 50%	施工进度 40%
			起点、海徐路、赵家沟秀林公园绿道主线（3 公里）	与公园同步推进	
外环驿站	建成开放 (16 座)	浦东新区	沿北公园驿站、高东生态园驿站	建成	
			海徐路公园驿站、绿环驿起点站、孙桥公园驿站	与公园同步推进	
			赵家沟驿站、双江路驿站、三林 02 驿站、咸塘港周边驿站	施工进度 50%	施工进度 40%
		宝山区	大黄村公园 01 驿站、02 驿站、元吉公园驿站	与公园同步推进	

项目类型	年度计划	区段	项目	9 月计划	实际进度
			顾村公园 01 驿站、02 驿站	设计招标	招标代理招标
		闵行区	体育公园驿站、黎安公园驿站	已建成	
			文化公园驿站	进场施工	实施路径未明确，严重滞后
绿道断点	贯通 (17 处)	浦东新区	无名河 1#、同汾泾	已贯通	
			无名河 2#	施工进度 50%	施工进度 40%
		徐汇区	东新港	已贯通	
			华泾公园、长华路断点	项目施工	建设收尾
		普陀区	武威路、金昌路	已贯通	
			真南路	施工、监理招标完成	建设收尾
		宝山区	胡庄公园、大黄村公园、锦秋路断点	已贯通	
			顾村公园	前期准备	确定实施方案
		闵行区	梅陇港、华泾港	进场准备	开工备案、土地手续办理， 滞后
		嘉定区	陇南路、建新路	贯通	贯通
	开工建设 (35 处)	浦东新区	南浜沟、凌横浜断点、友谊河、北茅柴沟	施工进度 50%	施工进度 40%
			横沔港	项目开工	项目开工
			滨江森林公园、港城公园、高东公园、高东生态园、金海公园、金海湿地公园、华夏公园	方案完善	方案完善
			汤巷公园断点、沔青公园	已贯通	
			创新路、唐龙路断点	工可批复	工可评审
			涵林路断点	施工进场	施工进场
			晚亭路	农转用办理	农转用办理
			银樽路断点	初设批复	初设评审

项目类型	年度计划	区段	项目	9月计划	实际进度
		普陀区	新槎浦河断点	施工、监理招标完成	施工招标
		宝山区	新槎浦河断点	方案完善	专报区政府，滞后
		闵行区	兴南路、黎安路、农南路、沈长浜路、体育公园、黎安公园、梅富路、莘朱路断点	初设批复/概算批复	前期研究，严重滞后
		徐汇区	徐汇滨江公园断点	与公园同步推进	
			老沪闵路	工可批复	前期研究，滞后
		嘉定区	丰华路、京沪高速断点	与公园同步推进，受原水工程影响	
			沪宁高速、沪杭高速断点	工可批复	前期研究，滞后

（二）楔形绿地

区段	项目名称	年度计划	9月计划	实际进度
浦东新区	三林滨江南片区 2、3、10 号公共绿地	基本建成	总体进度 60%	总体进度 3%
	三林滨江南片区动之谷 4 号公共绿地	基本建成	施工进度 70%	施工进度 37.5%
	森兰五洲大道 300 米绿带	基本建成	施工进度 60%	施工进度 28%
	北蔡楔形绿地 A01-01、A02-01、A05-02 地块防护绿地	基本建成	绿化种植区域进度 80%	绿化种植区域施工进度 50%
	北蔡楔形绿地 C11b-01、C11b-03 等四个地块绿地	基本建成	绿化种植区域进度 75%	绿化种植区域施工进度 32%
	北蔡楔形绿地 C15-03、C15-04 等六个地块绿地	基本建成	绿化种植区域进度 75%	绿化种植区域施工进度 32%
	北蔡楔形绿地 C12-07、D01-01 等 8 个地块绿地	基本建成	绿化种植区域进度 30%	绿化种植区域施工进度 23%
宝山区	南大智慧城中央公园及停车库新建工程	基本建成	总体进度 50%	总体进度 19%
	康家村“城中村”改造结构绿地二期长康路东侧地块项目	基本建成	施工招标	完成工可批复，滞后

（三）重点绿化

区段	项目名称	年度计划	9 月计划	实际进度
静安区	新建 472 街坊公共绿地	基本建成	基本建成	项目竣工
	白遗桥绿地（一期）	开工建设	工可评审/方案公示	规划调整、项建报批
	市北高新园区 17-01	基本建成	基本建成	项目竣工
	市北高新园区 17-03	施工进度 70%	施工进度 36%	完成施工、监理招标
	市北高新园区 21-01	基本建成	开工备案/施工许可办理	工可批复
	市北高新园区 22-03		项目开工	施工招标
	市北高新园区 22-05		项目开工	开工建设
	万荣绿地二期	开工建设	工可、方案批复	项建评审
长宁区	一纺机地块公共绿地	工可批复	方案上报、评审、批复	土地征收
普陀区	真如绿廊（A10B-03 地块）	施工进度 80%	施工进度 25%	开工备案完成
	金光绿地（一期）	施工进度 80%	施工进度 60%	施工进度 60%
	金光绿地（二期）	施工进度 30%	施工进度 15%	施工进度 15%
	苏州河岸线公园一期	施工进度 70%	施工进度 35%	施工进度 35%
	甘泉公园改造提升	开工建设	施工图深化	施工图深化
	祥和公园改造提升	开工建设	施工图深化	施工图深化
	武宁公园改造提升	基本建成	施工进度 75%	施工进度 80%
	长风公园改造提升	施工进度 40%	施工进度 25%	开工准备
	长寿公园改造提升	施工进度 80%	施工进度 55%	施工进度 55%
杨浦区	大桥公园二期	施工进度 25%	工可、方案批复	方案批复
宝山区	美兰湖中央公园	基本建成	施工进度 90%	施工进度 77%

区段	项目名称	年度计划	9月计划	实际进度
	逸仙公园	基本建成	施工进度 92%	施工进度 88%
	南大中央公园	基本建成	总体进度 50%	总体进度 19%
	泰和污水厂配套公共绿地二期	开工建设	工可上报、评审	年内暂停实施
	吴淞创新城公园绿地	开工建设	项建上报	完成工可（初设）编制
	顾村拓展区二期绿地	开工建设	项建批复	项建待批
	南大走马塘沿线绿地	开工建设	工可上报、评审	启动段项建待批
闵行区	马桥人工智能体育公园（一期）	建成	总体进度 60%	完成施工招标
	前湾公园一期工程	施工进度 60%	施工进度 52%	施工进度 50%
	黄浦江滨江西延伸公园	施工进度 50%	施工、监理上网招标	年内暂停实施
嘉定区	苏河源综合公园	施工进度 70%	施工进度 50%	施工进度 50%
	赵泾绿地	工可批复	项建批复	方案研究，滞后
金山区	亭林新社区公共绿地	施工进度 30%	开工备案/施工许可办理	初设批复
	新枫公共绿地	基本建成	施工进度 90%	施工进度 88%
	金山工业区大道南侧绿地	基本建成	施工进度 20%	初设批复
	金山大道公园绿地	开工建设	初设批复	年内暂停实施
松江区	松江新城中央公园（思贤公园）	基本建成	基本建成	总体进度 80%
	松江新城中央公园（中央绿带）	开工建设	初设批复	启动施工招标
	华阳湖公园	施工进度 70%	施工进度 40%	规划方案待批，严重滞后
青浦区	上达中央公园南园（一期）	基本建成	施工进度 80%	施工进度 85%
	上达中央公园北园（一期）	工可批复	项建批复	项建批复
	港俞路东侧绿地	开工建设	施工、监理上网招标	工可待评
	环城水系三期景观绿地	基本建成	施工进度 95%	施工进度 93%
奉贤区	田字绿廊公园	基本建成	基本建成	施工进度 96%

备注：上述滞后或严重滞后的项目请各区加快推进进度，确定无法实施或需调整项目的，请各区尽快上报推进办批复同意后予以调整。

报送：市绿化市容局党政领导班子

主送：环城生态公园带暨重点绿化建设项目协调推进领导小组成员、各项目实施单位

环城生态公园带暨重点绿化建设项目协调推进办公室

2024 年 9 月 30 日

（共印 35 份）
